



PLATAFORMA DE GESTIÓN Y REGISTRO DE COMPETENCIAS DE
ROBÓTICA

Presentación Ejecutiva de Avance del Proyecto

77.1%

Avance Real

27/35

Elementos Cerrados

7

Incidentes

\$0

Presupuesto Usado

Estado Ejecutivo del Proyecto

100%

Avance Esperado

77.1%

Avance Real

22.9%

Desviación

6/8

Paquetes Cerrados



Análisis de desviación

La ejecución funcional está mayormente cerrada. La desviación se concentra en actividades administrativas y técnicas de cierre:

! Google Calendar (on hold)

! Prueba de carga (on hold)


! Respaldo automático

! Presentación final y firma

Estado de Paquetes de Trabajo



Tareas Cerradas vs Pendientes

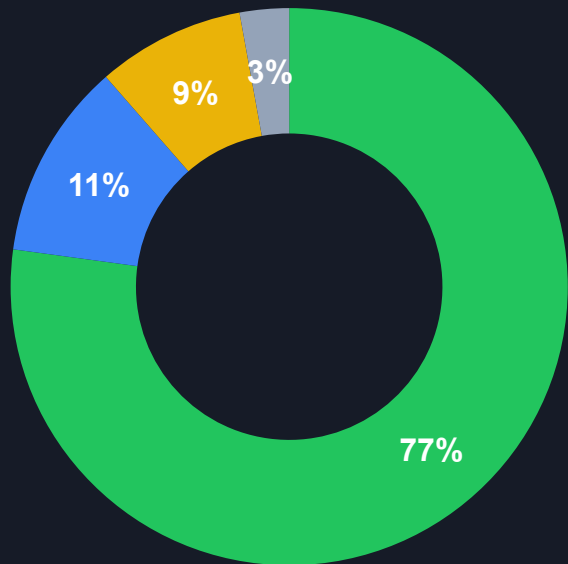

■ Cerradas ■ En progreso ■ En espera ■ Nuevo



27

Cerradas

Módulos funcionales y documentación principal



4

En progreso

Gestión, revisión, presentación y cierre



3

En espera

Calendar, carga, respaldo automático




1

Nuevo

Firma de cierre

Bitácora de Incidentes

Hallazgos que requirieron acción de control

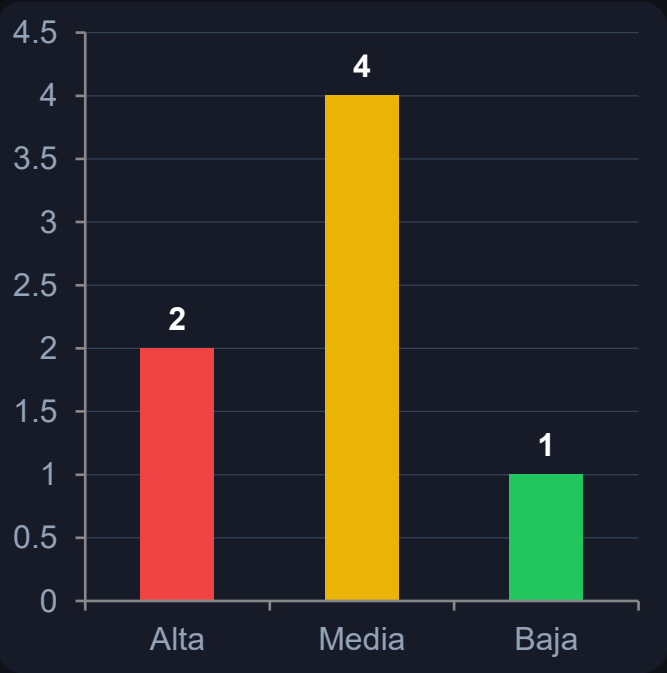

INC-01	Ajustes visuales CRODIT	Media	En control
INC-02	Categorías en inscripción	Alta	Corregido
INC-03	Participantes desde coach	Alta	Corregido
INC-04	Latencia	Media	En seguimiento
INC-05	Google Calendar	Baja	On hold
INC-06	Pruebas de carga	Media	On hold
INC-07	Fallas en dispositivo	Media	En control

Presupuesto y Alcance

Control de costo y principales pendientes

\$0

MXN Presupuesto utilizado

Google Apps Script · Sheets · Drive · Gmail · OpenProject



Google Calendar

Mantener on hold como mejora no crítica



Prueba de carga

Documentar pendiente y ejecutar si hay ventana técnica



Respaldo automático

Formalizar antes de cierre operativo



Firma de cierre

Agendar aprobación final con dueño

Stack Tecnológico

Google Apps Script

Backend y Frontend

Google Sheets

Base de datos y almacenamiento

Google Drive

Gestión de evidencias

Gmail

Notificaciones automáticas

Google OAuth

Autenticación y registro

OpenProject

Gestión del proyecto

Cierre Ejecutivo

Acciones requeridas para terminar formalmente

01

Finalizar presentación



Completar la revisión ejecutiva.

02

Resolver pendientes



Calendar, carga y respaldo: cerrar o documentar como backlog.

03

Validar privacidad



Confirmar permisos restringidos en evidencias de Drive.

04

Firmar cierre



Obtener aprobación del dueño y archivar entregables.

Conclusión: el producto funcional se encuentra considerablemente terminado; el objetivo final es control administrativo, evidencia y aceptación.
